

発行日 平成31年 2月 8日

発行者 釧路市上下水道部

定点撮影：平成31年 2月

愛国浄水場 更新事業

— 第二期工事 —

進捗状況

No. 6

平成30年12月より既設配水池（1号～3号）の取壊工を進めております。現時点までに屋根及び壁・柱の取壊しを終えました。今後は3月末頃までに床面の取壊しを行い、取壊工を終了する予定となっております。



取壊開始直後




屋根・壁・柱取壊完了
→ 今後は床面の取壊しへ




取壊し状況です。コンクリートの厚さは約20cm～50cmあり、これを圧砕機で取壊します。

配水池1号～3号の屋根・壁・柱を取壊し終えた状況です。2号→1号→3号の順番で取壊しました。

取壊断面図

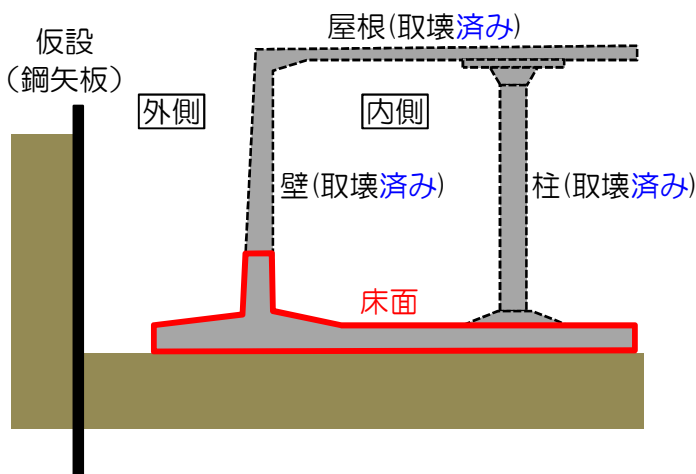

取壊し配水池の断面図です。これまでに屋根・壁・柱の取壊しを完了し、**2～3月末までの期間において床面を取壊す予定となっております。**

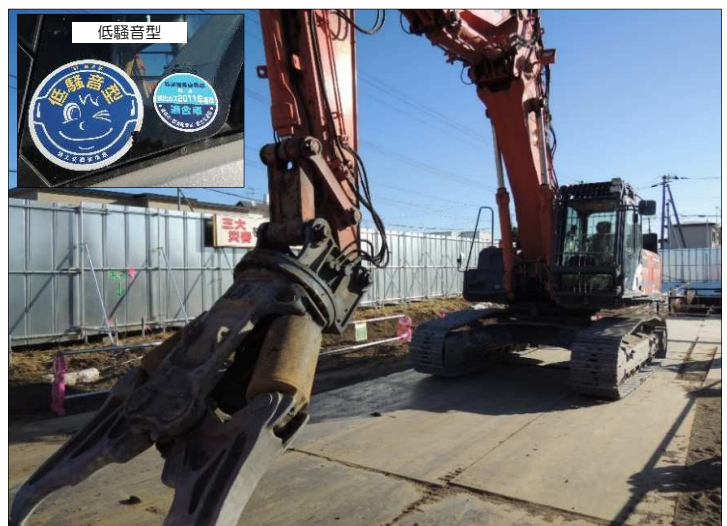

低騒音型の建設機械を採用し騒音対策に努めており、ここまで騒音計・振動計は基準内の数値となっております。
