

愛国浄水場 更新事業

－ 第二期工事 －

進捗状況

No. 18


発行日 令和6年6月26日

発行者 釧路市上下水道部

定点撮影：令和6年6月




現在、建物2階部分のコンクリート工事と並行して建物内部の内装工事やプラント設備工事等を進めております。建物躯体のコンクリート工事は7月中旬に完了する予定となっております。

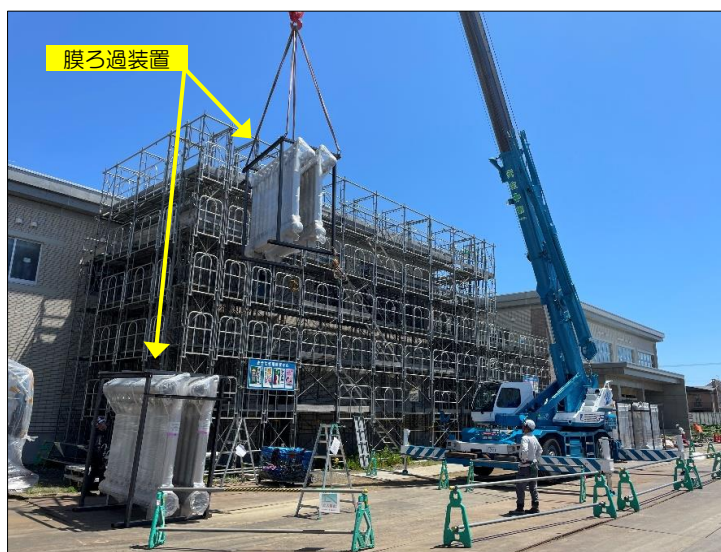

膜ろ過装置の搬入状況です。大きな機器や資材はクレーンにより屋上から搬入しています。



電気室（2階）です。浄水場の運転に必要な電気を供給するための設備です。

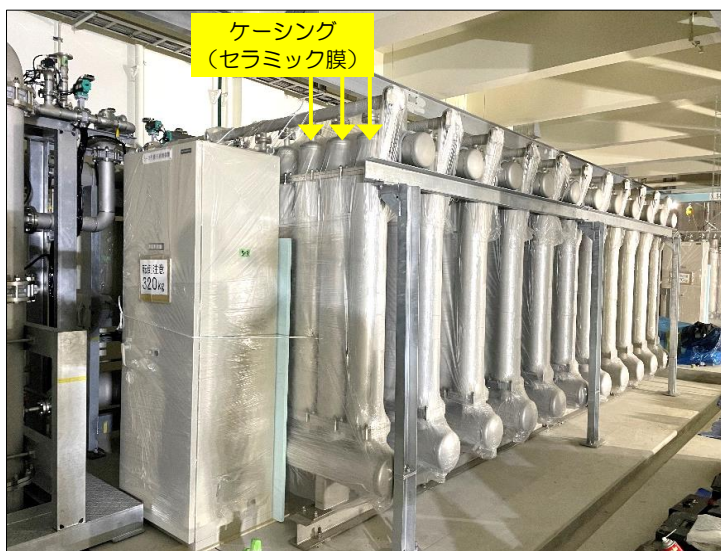

膜ろ過装置です。膜ろ過装置は原水（河川水）を浄水処理するための装置で、1本1本のケーシングの中にセラミック膜が入っています。



中央監視室です。水道施設の水量や水質を監視するための大型モニターや専用PCが設置されます。
